
본사 A제품 3라인 AGV 도입

물류 자동화 | 진행 | 기준선 유지 | 임계 작업 2

위치	담당	기간	현재 단계
한국 · A제품 · 3라인 · 1F	김물류 (운영기술그룹 · 자동화파트)	2026-06-21 ~ 2026-12-15	검수 (목표 10-31)

55%

✓ 검토	✓ 품의	✓ 발주	✓ 제작	∘ 검수	입고	현장 설치	안정화
완료 07-09	완료 08-02	완료 08-20	완료 10-11	목표 10-31 체크 3/3	목표 11-06 체크 0/2	목표 11-28 기준선 +3일	목표 12-15

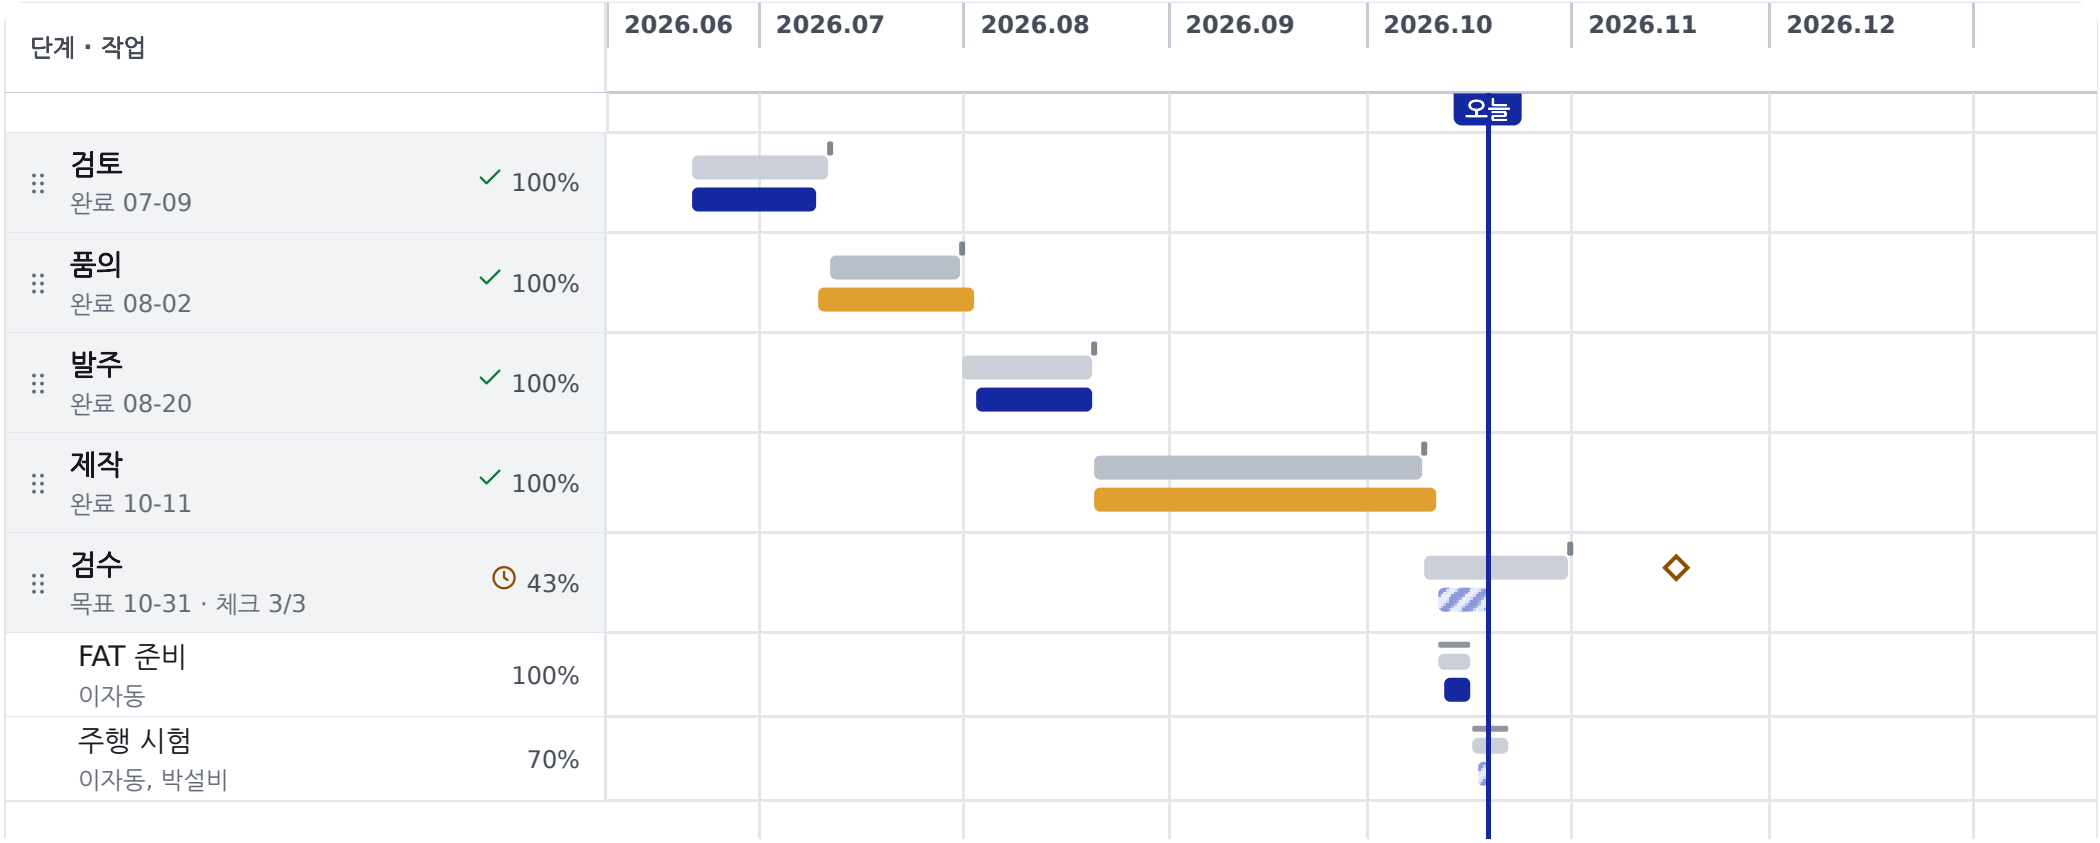


검수 문서 검토
김물류
0%
안전 인증 서류 준비
평영, 신규담당
0%
입고
목표 11-06 · 체크 0/2
0%
현장 설치
목표 11-28
0%
안정화
목표 12-15
0%
목표
실적(완료)
실적(진행 중)
초과 완료
지연
시작 전
예상 지연
예상 종료
기준선
임계
