대시보드

기준 10-17 13:59 (한국 시간)

진행 과제
6
보류 1

⚠ 지연
2
목표일 초과

7일 내 목표
2
과제 기준

올해 완료
2
2026 년

지연 위험
위험 **3** · 정체 **0**
예상 초과·밀린 작업 / 14일 변경 없음

지연 과제 2

동남아 C제품 2라인 AMR 확대
동남아 · 제작 단계 · 이자동
제어기 보드 입고 완료, 조립 재개 — 박설비
⚠ 지연 D+6

유럽 C제품 창고 입출고 개선
유럽 · 검토 단계 · 김물류
⚠ 지연 D+3

지연 위험 3 지연 징후 과제

본사 A제품 3라인 AGV 도입
'검수' 예상 종료가 목표일보다 18일 늦음 · 다른 과제 단계 연결 위반…
내가 남긴 메모 — 평영
예상 +18일

본사 2공장 물류 동선 Simulation
'모델링' 예상 종료가 목표일보다 4일 늦음
예상 +4일

미주 B제품 용기 표준화
다른 과제 단계 연결 위반 1건
위험

다가오는 일정 14 일 이내

미주 B제품 용기 표준화 D-3
발주 · 10-20

본사 2공장 물류 동선 Simulation D-7
모델링 · 10-24


동남아 C제품 2라인 AMR 확대 D-10
검수 · 10-27

유럽 C제품 창고 입출고 개선 D-10
보고 · 10-27


본사 A제품 3라인 AGV 도입 D-12
검수 · 10-29

미주 A제품 AGV 도입 검토 D-14
검토 · 10-31 · 새 활동 1

진행 과제 일정 6

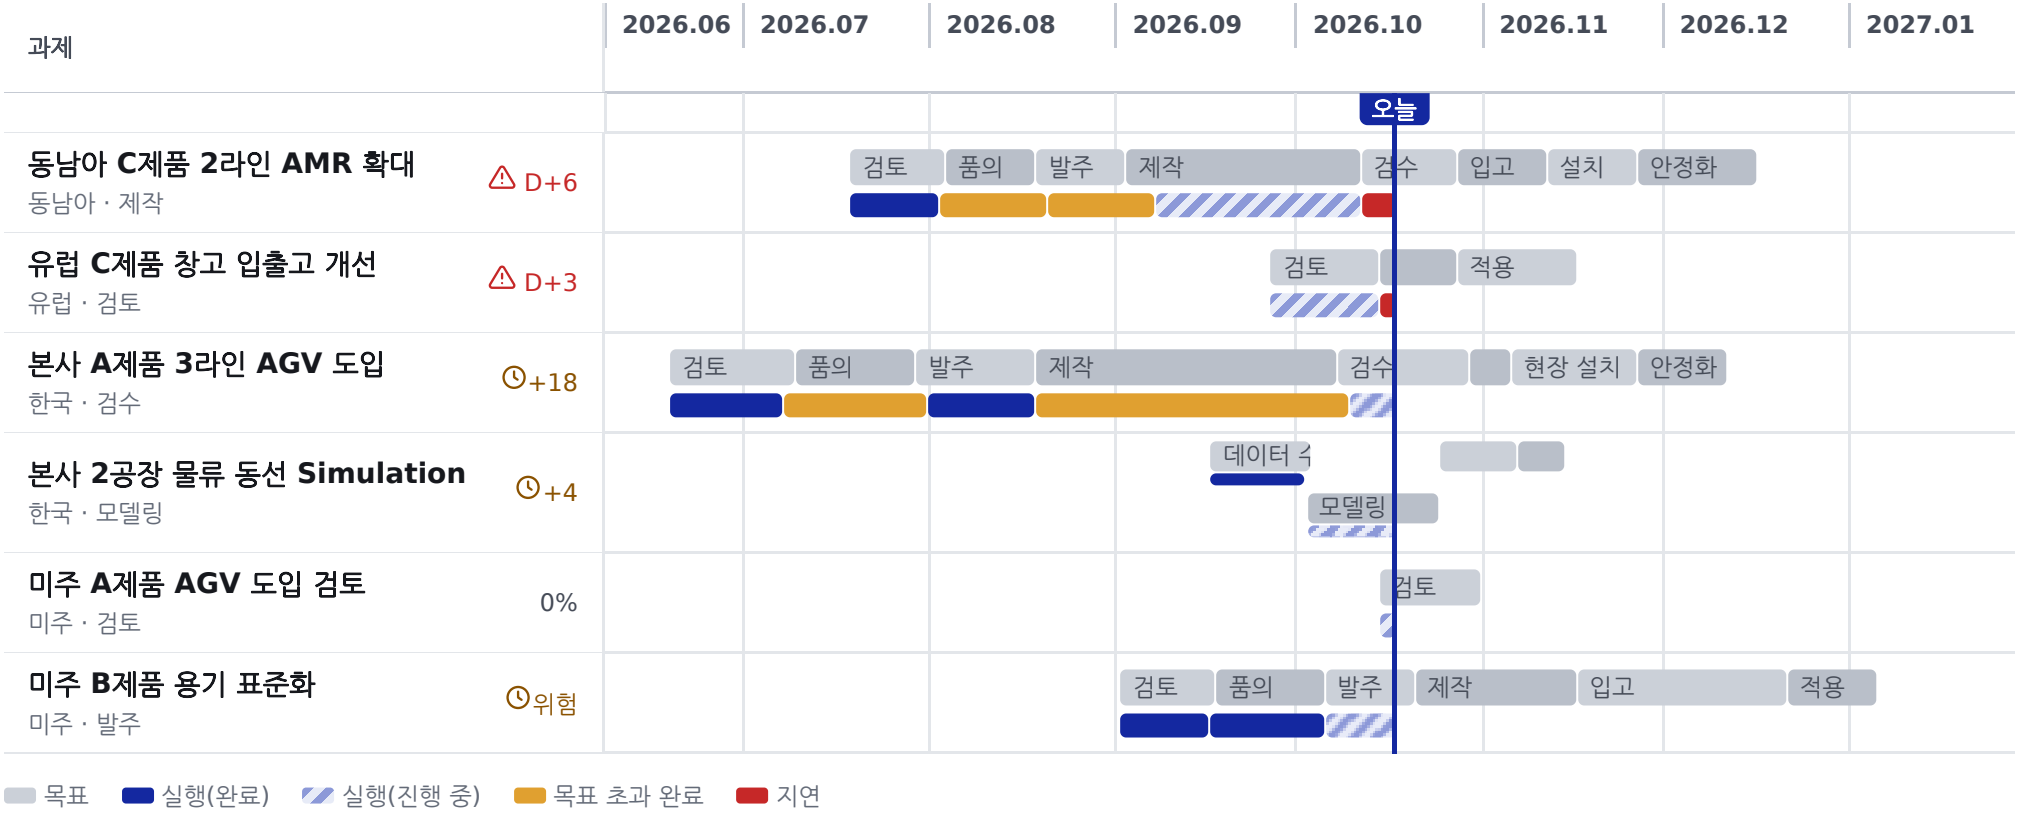
과제
2026.06
2026.07
2026.08
2026.09
2026.10
2026.11
2026.12
2027.01
오늘
동남아 C제품 2라인 AMR 확대
동남아 · 제작
D+6
검토
품의
발주
제작
검수
입고
설치
안정화
유럽 C제품 창고 입출고 개선
유럽 · 검토
D+3
검토
적용
본사 A제품 3라인 AGV 도입
한국 · 검수
+18
검토
품의
발주
제작
검수
현장 설치
안정화
본사 2공장 물류 동선 Simulation
한국 · 모델링
+4
데이터 수
모델링
미주 A제품 AGV 도입 검토
미주 · 검토
0%
검토
미주 B제품 용기 표준화
미주 · 발주
위험
검토
품의
발주
제작
입고
적용
목표
실행(완료)
실행(진행 중)
목표 초과 완료
지연

유형별 현황

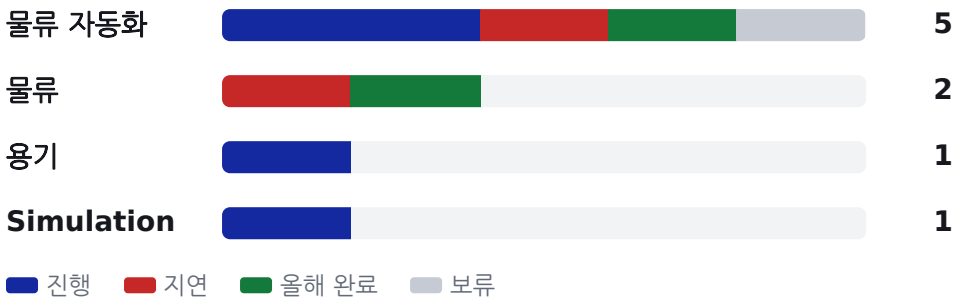

진행·보류 과제와 올해 끝난 과제만 셉니다

법인별 현황

